

数量計算書

目 次

1. 数量総括表	1
2. 道路土工	7
掘削工・盛土工	8
残土処理工	12
3. 擁壁工	14
作業土工	15
重力式擁壁工	17
プレキャストL型擁壁工	25
4. 排水構造物工	29
作業土工	30
側溝工	33
集水桝工	38
5. 舗装工	41
舗装準備工	42
車道舗装	44
6. 道路附属施設	46
区画線工	47
7. 構造物撤去工	48
構造物取壊し工	49
運搬処理工	55

1. 数量総括表

数量総括表

設計名：町道黒瀬道/間線

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

[illegible]

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		床掘り	土砂	m3	10.1	10				
		埋戻し	D	m3	3.1	3				
		基面整正		m2	9.9	9				
	側溝工									
		PU300	PU300A	m	35.3	35				
		間詰めコクリート	18-8-40	m3	1.1	1				
	集水枳工									
		集水枳工	500×500×600	箇所	1.0	1				
舗装工										
	舗装準備工									
		不陸整正		m2	177.5	177				

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
	車道舗装									
		表層	再生密粒度アスコン t=5cm W<1.4m	m2	177.5	177				
		上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m2	177.5	177				
		下層路盤	再生クラッシャランRC-40 t=10cm	m2	177.5	177				
道路付属施設工										
	区画線工									
		熔融式区画線	外側線 白色 W=15cm	m	90.3	90				
構造物撤去工										
	構造物取壊し工									
		コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	1.9	1				
		コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	0.1	0				

[illegible]

2. 道 路 土 工

掘 削 工 ・ 盛 土 工

土工数量内訳書

種 別：道路土工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式	数 量
土砂掘削	土工計算書より	26.7 m3
盛土工	土工計算書より	1.4 m3

道路土工数量計算書

名 称：掘削工

測 点	距 離(m)	掘削						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0-42. 0	—	0. 8	—	—		—	—	
NO. 0-40	2. 0	0. 6	0. 70	1. 4		0. 00	0. 0	
NO. 0-36. 803	3. 2	0. 8	0. 70	2. 2		0. 00	0. 0	SP. 1
No. 0-34. 47	2. 3	0. 3	0. 55	1. 3		0. 00	0. 0	EC. 1転用
NO. 0+32. 778	1. 7	0. 3	0. 30	0. 5		0. 00	0. 0	EC. 1
NO. 0-27. 0	5. 8	0. 4	0. 35	2. 0		0. 00	0. 0	
NO. 0-20. 6	6. 4	0. 3	0. 35	2. 2		0. 00	0. 0	
NO. 0-18. 6	2. 0	0. 3	0. 30	0. 6		0. 00	0. 0	NO. 0-20. 6転用
NO. 0-15. 7	—	1. 0	—	—		—	—	EC. 2転用
NO. 0-13. 203	2. 5	1. 0	1. 00	2. 5		0. 00	0. 0	EC. 2
NO. 0-8. 0	5. 2	0. 7	0. 85	4. 4		0. 00	0. 0	
NO. 0-4. 465	3. 5	0. 8	0. 75	2. 6		0. 00	0. 0	BC. 3
NO. 0	4. 5	0. 8	0. 80	3. 6		0. 00	0. 0	
NO. 0+0. 5	0. 5	0. 8	0. 80	0. 4		0. 00	0. 0	NO. 0転用
NO. 0+3. 0	2. 5	0. 7	0. 75	1. 9		0. 00	0. 0	
NO. 0+4. 5	1. 5	0. 7	0. 70	1. 1		0. 00	0. 0	NO. 0+3 転用
小 計	43. 6			26. 7			0. 0	
合 計	43. 6			26. 7			0. 0	

道路土工数量計算書

名 称：盛り土

測 点	距 離(m)	盛土						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0-42. 0	—	0. 0	—	—		—	—	
NO. 0-40	2. 0	0. 1	0. 05	0. 1		0. 00	0. 0	
NO. 0-36. 803	3. 2	0. 1	0. 10	0. 3		0. 00	0. 0	SP. 1
No. 0-34. 47	2. 3	0. 0	0. 05	0. 1		0. 00	0. 0	EC. 1転用
NO. 0+32. 778	1. 7		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	EC. 1
NO. 0-27. 0	5. 8		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	
NO. 0-20. 6	6. 4		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	
NO. 0-18. 6	2. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	
NO. 0-15. 7	—	0. 0	—	—		—	—	EC. 2転用
NO. 0-13. 203	2. 5	0. 0	0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	EC. 2
NO. 0-8. 0	5. 2	0. 1	0. 05	0. 3		0. 00	0. 0	
NO. 0-4. 465	3. 5	0. 1	0. 10	0. 4		0. 00	0. 0	BC. 3
NO. 0	4. 5	0. 0	0. 05	0. 2		0. 00	0. 0	
NO. 0+0. 5	0. 5		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	NO. 0転用
NO. 0+3. 0	2. 5		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	
NO. 0+4. 5	1. 5		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	NO. 0+3 転用
小 計	43. 6			1. 4			0. 0	
合 計	43. 6			1. 4			0. 0	

残 土 处 理 工

数量内訳書

種 別：残土処理工
ブロック：残土処理
区 分：

細別／規格	算 式	数 量
残土処理	道路土工 掘削工= 26.7 m3 盛土工= 1.4 m3 作業土工 擁壁工 床掘= 128.6 m3 埋戻= 79 m3 側溝工 床掘= 10.1 m3 埋戻= 3.1 m3 残土処理 $26.7 + 128.6 + 10.1 - (1.4 + 79.0 + 3.1) / 0.9 =$	72.6 m3

3. 擁壁工

擁壁構造物作業土工集計表

種 別：作業土工

細 別	規 格	単位	作業土工				合 計	摘 要
			重力式擁壁	プレキャストL型擁壁				
床掘	土砂	m3	128.6				128.6	
埋戻し	D	m3	79.0				79.0	
基面整正		m2	10.3	21.4			31.7	

構造物土工数量計算書

名 称：プレキャストL型擁壁・重力式擁壁

測 点	距 離(m)	床堀			埋め戻し			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0-42. 0	—		—	—		—	—	
NO. 0-40	2. 0		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	
NO. 0-36. 803	3. 2		0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	SP. 1
No. 0-34. 47	2. 3	3. 6	1. 80	4. 1	2. 3	1. 15	2. 6	EC. 1転用
NO. 0+32. 778	1. 7	3. 6	3. 60	6. 1	2. 3	2. 30	3. 9	EC. 1
NO. 0-27. 0	5. 8	4. 7	4. 15	24. 1	3. 2	2. 75	16. 0	
NO. 0-20. 6	6. 4	7. 8	6. 25	40. 0	5. 4	4. 30	27. 5	
NO. 0-18. 6	2. 0	7. 8	7. 80	15. 6	5. 4	5. 40	10. 8	
NO. 0-15. 7			0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	EC. 2転用
NO. 0-13. 203	2. 5	1. 8	0. 90	2. 3	0. 9	0. 45	1. 1	EC. 2
NO. 0-8. 0	5. 2	3. 1	2. 45	12. 7	1. 2	1. 05	5. 5	
NO. 0-4. 465	3. 5	3. 2	3. 15	11. 0	1. 4	1. 30	4. 6	BC. 3
NO. 0	4. 5	2. 0	2. 60	11. 7	1. 4	1. 40	6. 3	
NO. 0+0. 5	0. 5	2. 0	2. 00	1. 0	1. 4	1. 40	0. 7	NO. 0転用
小 計	39. 6			128. 6			79. 0	
合 計	39. 6			128. 6			79. 0	


重力式擁壁工

重力式擁壁工数量集計表

名 称			種 別	単 位	数 量						合 計	摘 要
					1号	2号						
本 体 工	コン ク リ ー ト	小型擁壁（A）	H：平均高 $\leq$ 1.0m	m ³								
		重力式擁壁	1.0m<H：平均高<2.0m 18-8-40	m ³	0.999	7.188					8.187	
			2.0m $\leq$ H：平均高 $\leq$ 5.0m 18-8-40	m ³	0.196	0.000					0.196	
			計		1.195	7.188					8.383	
		基 礎 材	RC-40：t=20 c m超え	m ²	—	—						
			RC-40：t=20 c m以下	m ²	1.294 ○	9.011 ○					10.305	
		均しコンクリート		必 要 性	—	—						
		水 抜 パ イ プ	VP ϕ 75（1箇所／3.0m ² ）	必 要 性	無し	○						
		吸出防止材	300×300×50t	必 要 性	無し	○						
		目 地 材	瀝青繊維質目地材、t=10mm	必 要 性	無し	○						
	作 業 土 工											
		基 面 整 正	土 砂 部	m ²	1.3	9.0					10.3	

第 1 表

1 号 重 力 擁 壁 入 力 表

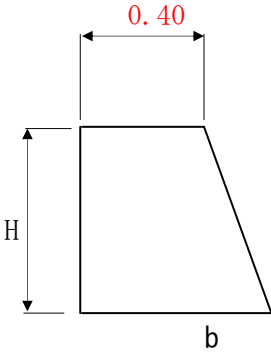 S= 1:0.5 基礎材 (RC40) 厚 0.2 m 水抜きパイプ (VP75) 不要 吸出防止材 (300 * 300、t=50) 不要 目地材 (瀝青繊維質 目地材、t=10) 不要	測点	单距離 (m)	H (m)	SL (m)	b (m)	A (m2)
		0.000	2.110	2.359	1.455	1.957
		0.100	2.110	2.359	1.455	1.957
	N0.0-18.6	0.900	0.500	0.559	0.650	0.263
	計	1.000	m			

[illegible]

第 2 表

2 号 重 力 擁 壁 計 算 書

測点	単距離	高さ	断面	小型擁壁(A)0.5から1.0まで			コンクリート(1mを越え2m未満)			コンクリート(2mから5mまで)		
				断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積
	0.000	1.040	0.420				0.420					
N0.0-9.465	4.270	1.040	0.420				0.420	0.420	1.793			
N0.0-9.465	0.000	1.220	0.515				0.515					
BC.3	5.000	1.220	0.515				0.515	0.515	2.575			
BC.3	0.000	1.360	0.593				0.593					
N0.0+0.5	4.755	1.360	0.593				0.593	0.593	2.820			
計	14.03	m							7.188			

[illegible]

プレキャストL型擁壁工

延長調書

名 称：プレキャスト擁壁工

[illegible]

L型擁壁 数量計算表

1. 製品内訳

製品タイプ	個数	製品長	延長(L1)	底版幅(B)	基礎幅(B1)	備 考
H= 1000	2個	1.147m	2.294m	900mm	1000mm	短寸
H= 1000	1個	1.800m	1.800m	900mm	1000mm	短寸
H= 1400	2個	2.000m	4.000m	1200mm	1300mm	-
H= 1750	2個	2.000m	4.000m	1300mm	1400mm	-
H= 2100	2個	1.900m	3.800m	1600mm	1700mm	底版斜
合計	9個		15.894m			

2. 土粒子止めフィルター(水抜き穴用)土粒子止めフィルター面積A1 = 0.600m² (水抜き穴用)

水抜き穴は200mm角の吸出防止材を設置する。

A1 = 水抜き穴箇所数 × 0.04m²/箇所

※ 水抜き穴箇所数	4 箇所/個	→	0個	0.000m ²
	2 箇所/個	→	6個	0.480m ²
	1 箇所/個	→	3個	0.120m ²
			合計	0.600m ²

3. 土粒子止めフィルター(縦目地用) 土粒子止めフィルター面積A2 = 2.504m² (縦目地用)

A2 = (擁壁縦目地高さ - 底版厚) × 幅(200mm)

製品高さ	底版厚	個数	フィルター長さ	フィルター幅	フィルター面積
h=1.000	h'=0.100	2個	0.900m	0.200m	0.360m ²
h=1.000	h'=0.100	1個	0.900m	0.200m	0.180m ²
h=1.400	h'=0.100	2個	1.300m	0.200m	0.520m ²
h=1.750	h'=0.120	2個	1.630m	0.200m	0.652m ²
h=2.100	h'=0.120	2個	1.980m	0.200m	0.792m ²
合計					2.504m ²

4. 裏込砕石 裏込砕石量V1 = 3.055m³

V1 = 砕石高さ × 砕石延長 × 幅(300mm)

製品タイプ	個数	砕石延長(L2)	砕石幅	砕石標準高さ	砕石量(V1)
H= 1000	2個	2.294m	0.300m	0.088m	0.061m ³
H= 1000	1個	1.800m	0.300m	0.088m	0.048m ³
H= 1400	2個	4.000m	0.300m	0.488m	0.586m ³
H= 1750	2個	4.000m	0.300m	0.838m	1.006m ³
H= 2100	2個	3.800m	0.300m	1.188m	1.354m ³
合計	9個	15.894m			3.055m ³

5. 止水コンクリート 止水コンクリート量V2= 0.278m3

V2= 碎石延長(L2)×幅(350mm)×厚み(50mm)

6. 基礎詳細

・基礎コンクリート 基礎コンクリート量v1= 2.135m3
基礎コンクリート面積a1= 21.354m2

v1= 各基礎幅(B1)＜ページ上を参照＞×厚み100mm×各全延長
a1= 各基礎幅(B1)＜ページ上を参照＞×各全延長

・基礎コンクリート型枠 基礎コンクリート型枠面積a2= 3.179m2

a2= 基礎コンクリート厚み100mm×延長×2(左右両側)
(※側面については計上しない)

・敷モルタル 敷モルタル量v2= 0.395m3

v2= 各底版幅(B)＜ページ上を参照＞×厚み20mm×各製品延長

・基礎碎石 基礎碎石量v3= 4.271m3
基礎碎石面積a3= 21.354m2

v3= 各基礎幅(B1)＜ページ上を参照＞×厚み200mm×各全延長
a3= 各基礎幅(B1)＜ページ上を参照＞×各全延長

4. 排水構造物工

作 業 土 工

排水構造物工作業土工集計表

種 別：作業土工

細 別	規 格	単位	作業土工				合 計	摘 要
			PU300	集水桝				
床掘	土砂	m3	10.1				10.1	
埋戻し	D	m3	3.1				3.1	
基面整正		m2	9.1	0.8			9.9	PU300は0.62*14.6

側溝作業土工計算書

名 称：床堀、埋戻

測 点	距 離 (m)	床堀			埋戻			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 0-42. 0	—		—	—		—	—	
NO, 0-40			0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	
NO, 0-36. 803			0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	SP. 1
No, 0-33. 8		0. 4	0. 20	0. 0	0. 1	0. 05	0. 0	EC. 1転用
NO, 0+32. 778	1. 0	0. 4	0. 40	0. 4	0. 1	0. 10	0. 1	EC. 1
NO. 0-27. 0	5. 8	0. 5	0. 45	2. 6	0. 1	0. 10	0. 6	
NO. 0-20. 6	6. 4	0. 5	0. 50	3. 2	0. 1	0. 10	0. 6	
NO, 0-18. 6	2. 0	0. 5	0. 50	1. 0	0. 1	0. 10	0. 2	
NO, 0-15. 7			0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	EC. 2転用
NO, 0-13. 203			0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	EC. 2
NO, 0-8. 0			0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	
NO. 0-4. 465			0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	BC. 3
NO, 0			0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	
NO, 0+0. 5		0. 7	0. 35	0. 0	0. 4	0. 20	0. 0	NO. 0+3転用
NO, 0+3. 0	2. 5	0. 7	0. 70	1. 8	0. 4	0. 40	1. 0	
NO, 0+4. 5	1. 5	0. 7	0. 70	1. 1	0. 4	0. 40	0. 6	NO. 0+3転用
小 計	19. 2			10. 1			3. 1	
合 計	19. 2			10. 1			3. 1	

側 溝 工

延長調書

名 称： 側溝工

[illegible]

数量計算書


細 別：PU300
規 格：

10 m当り

略 図

PU300型側溝

S=1/20

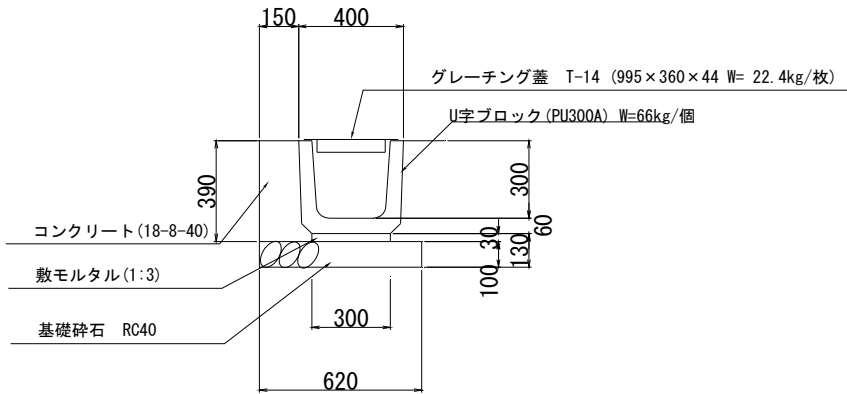


材料／規格	算 式	単 位	数 量
PU300	10.00/0.605		
0.6m/個 66kg/個		個	16.529
敷モルタル	0.30×10.0	m2	3.000
1:03 t=3cm	0.300×10.00×0.030	m3	0.090
基礎砕石	0.620×10.00		
RC-40 t=10cm		m2	6.200
コンクリート 18-8-40 (車道側添えコンクリート)	0.15×0.39×10.00	m3	0.585
型枠 (車道側添えコンクリート)	0.39×10.00		
		m2	3.900
グレーチング蓋 B300、並目 T-14 1.0m/枚 330×995×44 22.4kg/枚		枚	10.000
基面整正	0.620×10.00		
	作業土工へ計上	m2	6.200

数量計算書

細 別：PU300
規 格：間詰めコンクリート 1
NO. 0-18～EC. 1

1式当り

略 义

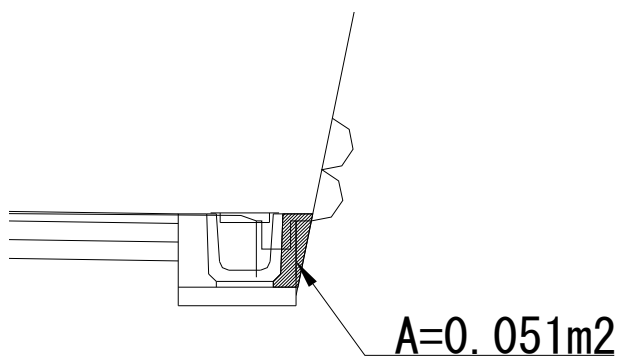

L= 14.6


[illegible]

数量計算書

細 別：PU300
規 格：間詰めコンクリート 2
NO. 0～EC. 2

1式当り

略 义



L= 14.0
擁壁区間のみ

[illegible]

集 水 枰 工

延長調書

名 称：集水枋工

單位：箇所

測点	工種	規格	数量	摘要
	集水桝工	500×500×600	1.0	
小計			1.0	
合計			1.0	

数量計算書


細 別：集水枳工
規 格：500×500×600

1 箇所当り

略 図

集水枳 500×500×600

S=1/20

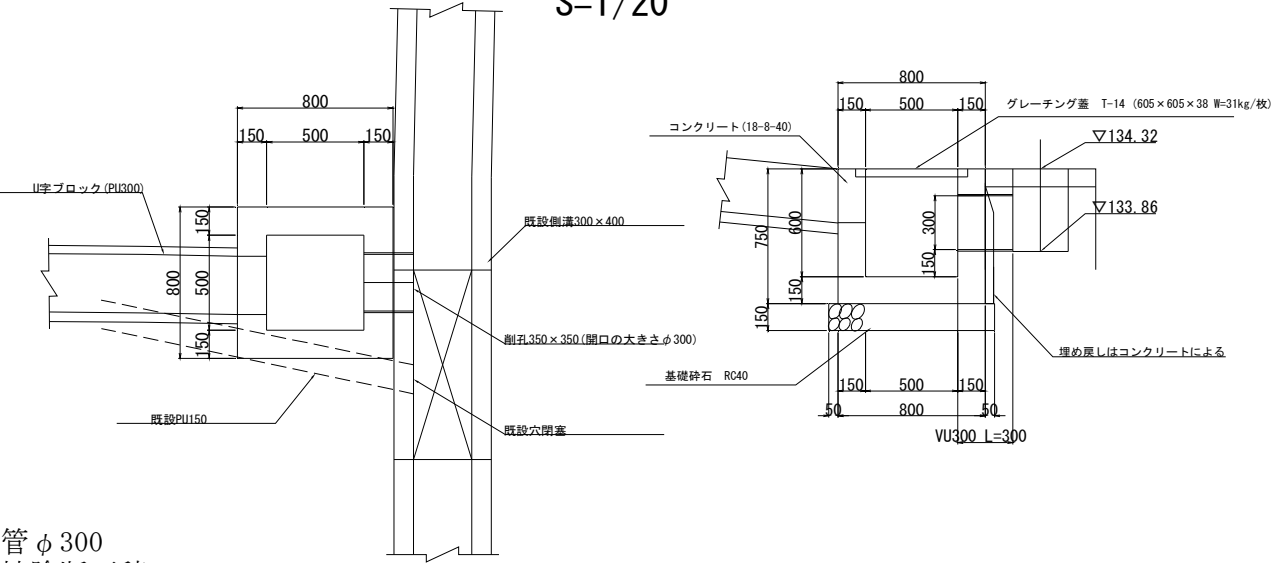

材料／規格	算 式	単 位	数 量
コンクリート 18-8-40	0.80*0.80*0.75-0.50*0.50*0.60-0.30*0.30*0.15- 0.078*0.15	m3	0.305
型枠 一般	(0.80+0.50)*0.75*4-(0.80*0.75)- 0.30*0.30*2-0.078*2	m2	2.964
基礎砕石 RC-40 t=15cm	0.900*0.900	m2	0.810
グレーチング枳蓋 T-14 500×500用 体`体`細目取手付 31.0+11.3kg/組 VU300		組	1.000
基面整正	0.90*0.90 作業土工へ計上	m	0.300
既設穴間詰め コンクリート 18-8-40	3.14/4*0.15*0.15*0.15	m2	0.810
		m3	0.003

5. 鋪 装 工

鋪 裝 準 備 工

数量内訳書

種 別：舗装準備工
ブロック：不陸整正
区 分：

細別／規格	算 式	数 量
不陸整正	車道舗装（下層路盤）面積 = 不陸整正面積 不陸整正	177.5 m2

車 道 舗 装

数量内訳書

種 別：車道舗装工
 ブロック：車道舗装工
 区 分：

細別／規格	算 式	数 量
表層工		
再生密粒度アスコン t=5cm	舗装計画平面より 車道舗装	89.1 88.4
	合計	177.5 m3
上層路盤		
粒度調整碎石 (M-30) t=10cm	舗装計画平面より 車道舗装	89.1 88.4
	合計	177.5 m3
下層路盤		
再生クラッシャーラン (RC-30) t=10cm	舗装計画平面より 車道舗装	89.1 88.4
	合計	177.5 m3

6. 道路付属施設

区画線工数量集計表

種 別：区画線工

[illegible]

7. 構造物撤去工

数量内訳書

種 別 : 構造物取壊し工
ブ ロ ッ ク : 構造物取壊し工
区 分 :

細別／規格	算 式	数 量
コンクリート構造 物取壊し	撤去平面図 及び 無筋構造物撤去数量計算書 より	
有筋	L型擁壁	1.54
撤去 PU150	24.7個	0.24
境界ブロック 150×150×600	13.3個	0.16
	計	1.94 m3
無筋	境界工	0.08 m3
石積み		18.2 m2

数量計算書

細別：PU150撤去
規格：有筋

14.8m 当り

略 図

鉄筋コンクリートU形側溝

150

S=1/10

敷モルタル

基礎材

参考質量 24 kg
製品有効長 0.600 m

材料／規格

算 式

単 位

数 量

有筋コンクリート

$$N = 14.8 / 0.6 = 24.7 \text{ 個}$$

$$V = (24 \text{ kg / 個}) / 2500 \times 24.7$$

m³


0.24

数量計算書

細別：L型擁壁取り壊し
規格：有筋

3.5m 当り

略 义

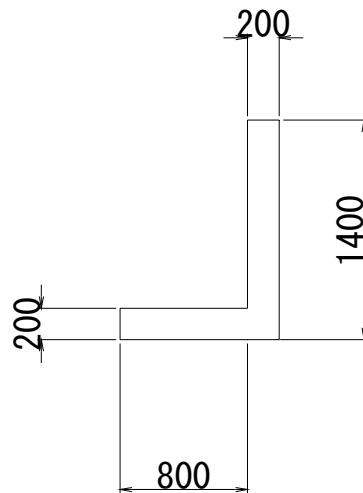
[illegible]

数量計算書

細 別：空石積み撤去
規 格：

1 式当り

略
図

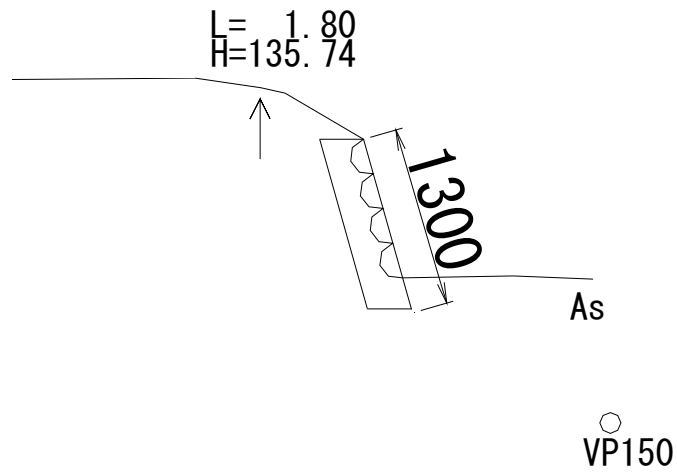


材料／規格	算 式	単 位	数 量
石積み	$A=1.30 \times 14.0$	m ²	18.2
	$V=18.2 \times 0.30$	m ³	5.46

数量計算書

細別：官民境界工
規格：有筋

8.0m 当り

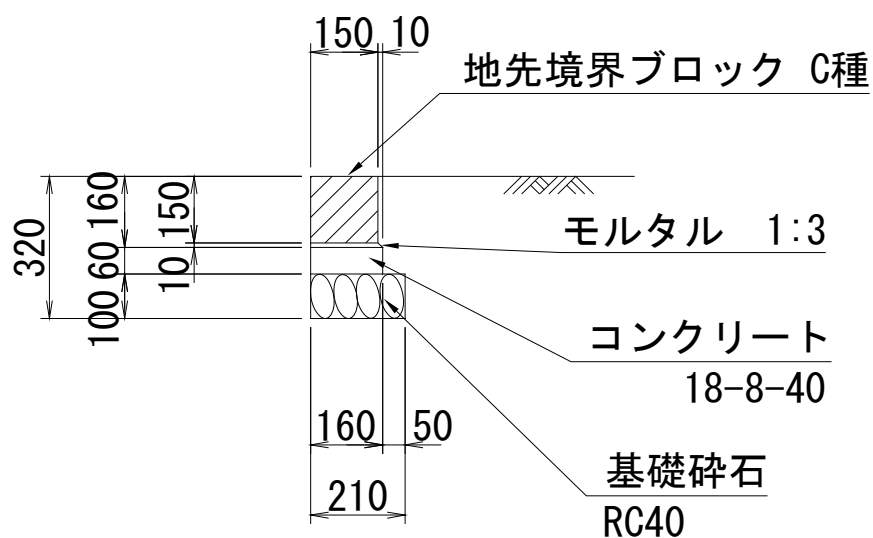

材料／規格	算 式	単 位	数 量
有筋コンクリート	N=8.0/0.6 =13.3個 31kg/個/2500*13.3	m3	0.16
無筋コンクリート	0.16*0.06*8.00	m3	0.08

数量内訳書

種別：車道舗装取り壊し
ブロック：車道舗装取り壊し
区分：

細別／規格	算 式	数 量
表層工 再生密粒度アスコン t=5cm	撤去取り壊し平面より 車道舗装	67.2 69.4
	合計	136.6 m2
舗装切断工 t=5cm	撤去取り壊し平面より 車道舗装 4.2+4.2	8.4 m

運 搬 処 理 工

数量内訳書

種別:運搬処理工
ブロック:運搬処理工
区分:

細別／規格	算 式	数 量
殻運搬処理 無筋コンクリート	構造物取壊し工より 	 0.08 0.08 m3
殻運搬処理 鉄筋コンクリート	構造物取壊し工より PU150 境界ブロック L型擁壁	 14.8 m 8.0 m 0.24 0.16 1.54 1.94 m3
殻運搬処理 アスファルト	構造物取壊し工より 舗装厚 5cm 136.6*0.05=6.83m3	 136.6 m2 6.8 m3
殻運搬処理 石	構造物取壊し工より 	 5.5 m3

工 事 日 数 計 算 書

工種：

No. 1

区分	施工内容	数量	単位	単位当り 作 業 量	作業班 編成数	実作業 日 数	稼働率 30/19	作業日数	備考
土砂掘削	BH0. 28m3	26.900	m3	38.000	1.000	0.710	1.120		Ⅱ-1-⑤-2
盛土		1.400	m3	120.000	1.000	0.010	0.020		Ⅱ-1-④-3
床掘	BH0. 45m3	129.100	m3	150.000	1.000	0.860	1.360		Ⅱ-1-②-4
埋戻	D	79.300	m3	33.000	1.000	2.400	3.790		I-12-①-1
重力式擁壁		8.400	m3	5.700	1.000	1.470	2.320		I-12-①-3
L型擁壁	H=1mを超え2m以下	12.100	m	38.000	1.000	0.320	0.510		Ⅱ-2-⑦-2
L型擁壁	H=2mを超え3.5m以下	3.800	m	30.000	1.000	0.130	0.210		Ⅱ-2-⑦-2
床掘		10.100	m3	150.000	1.000	0.070	0.110		Ⅱ-1-②-4
埋戻	D	3.100	m3	33.000	1.000	0.090	0.140		I-12-①-1
PU300		35.300	m	25.000	1.000	1.410	2.230		I-12-②-24
不陸整正		177.500	m ²	1,580.000	1.000	0.110	0.170		Ⅳ-1-①-1
表層		177.500	m ²	2,300.000	1.000	0.080	0.130		Ⅳ-1-②-2
上層		177.500	m ²	1,110.000	1.000	0.160	0.250		Ⅳ-1-①-1
下層		177.500	m ²	110.000	1.000	1.610	2.540		Ⅳ-1-①-1
区画線		90.300	m	1,500.000	1.000	0.060	0.090		I-12-②-2
アスファルト撤去		136.600	m ²	810.000	1.000	0.170	0.270		Ⅳ-3-②-5
						9.660			
