

1. 数量総括表

数 量 総 括 表

(レベル1) 工事区分	(レベル2) 工種	(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数 量	設計数量	備 考
	護床工							
		護床工	河床張コンクリート	t=200mm 18-8-40	m ³	1.8	1	
			捨てコンクリート	t=100mm以上 18-8-40	m ³	1.4	1	
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋(機械)	m ³	4.3	4	
		運搬処理工	殻運搬処理	ダンプトラック運搬4t Co殻	m ³	4.3	4	
	仮設工							
		仮設道路工	工事用道路	W=3.0m	m	20.0	20	
			敷鉄板	1500×3000,t=22mm	枚	13	13	
		仮締切工	掛樋工	ポリエチレン管φ600	m	8.5	8	
			土のう積		m ²	1.6	1	
		水替工	ポンプ排水	作業時	日	4.6	4	
			ポンプ据付・撤去		箇所	1	1	

2 . 土 工 計 算 書

土工配分図



3 . 護 岸 工 計 算 書

コンクリート護岸工


1式当たり

数量計算書

名称	区分	算式	単位	数量	略図
コンクリート	18-8-40	別紙計算書より	m ²	7.03	
型枠		〃	m ²	28.8	
均しコンクリート	18-8-40	8.62(別紙計算書より) × 0.10	m ³	0.86	
均し型枠		0.10*2*8.5	m ²	1.7	
目地材		1.02+0.70	m ²	1.7	

コンクリート護岸工数量計算書

測点	距離	形状寸法				コンクリート			型 枠			均しコンクリート			摘要
		H	n	B	B+200	断面積	平均	体積	長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	
NO.0	0.0	1.66	1:0.50	1.03	1.23	1.02	—	—	3.52	—	—	1.23	—	—	
NO.0+6.500	6.5	1.61	1:0.30	0.68	0.88	0.71	0.865	5.62	3.29	3.41	22.2	0.88	1.055	6.86	
NO.0+8.500	2.0	1.60	1:0.30	0.68	0.88	0.70	0.705	1.41	3.27	3.28	6.6	0.88	0.880	1.76	
計	8.5							7.03			28.8			8.62	

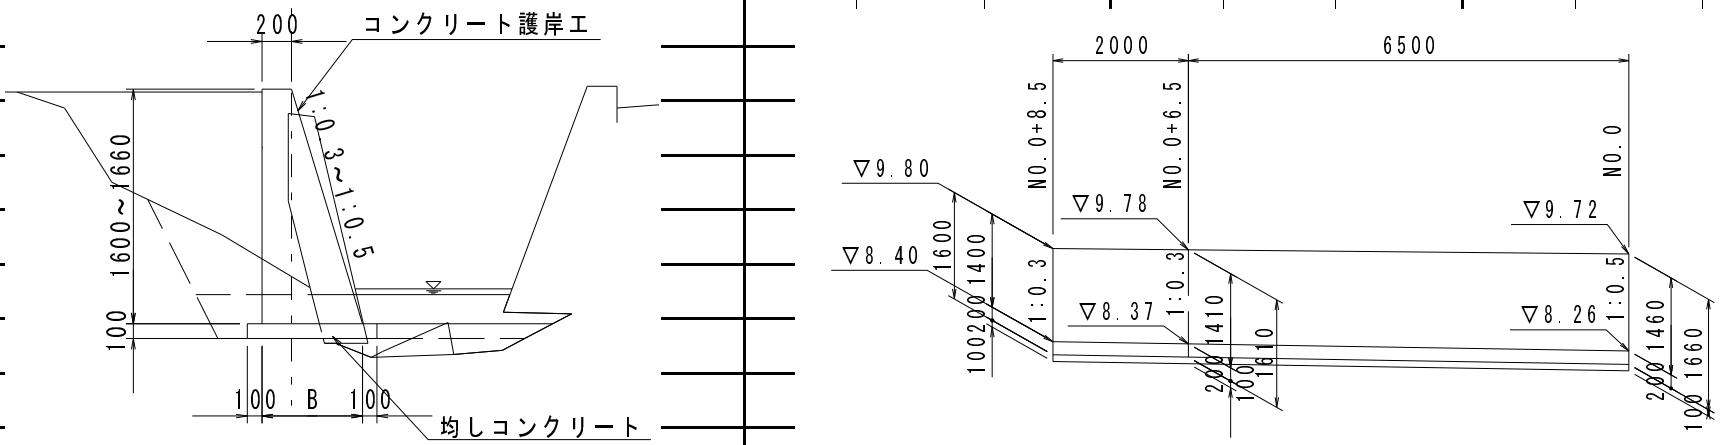

4 . 護 床 工 計 算 書

5. 構造物撤去工計算書

6 . 仮 設 工 計 算 書

水替え日数計算書

測点	距離	護岸高	勾配	法長	平均	面積
				-		
				-	-	-
				-	-	-
計	0.0					-

護岸工 L = 8.50

コンクリート	=	7.03	m3
型枠	=	28.80	m2
均しコン	=	0.86	m3
均し型枠	=	1.70	m2
基面整正	=	9.00	m2
河床張コンクリート			
コンクリート	=	1.82	m3
捨てコンクリート			
コンクリート	=	1.36	m3

日当り施工数量一覧表

工種	規格等		数量	日施工量		備考	
コンクリート打設	小型構造物	人力打設	0.86 ÷ 5 m3/日	0.2	日	基礎コンクリート等	
	無筋・鉄筋構造物	ポンプ、日300m3未満	10.21 ÷ 81 m3/日	0.2	日		
	間詰めコンクリート		÷ 4 m4/日		日		
	基面整正		9.00 ÷ 200 m2/日	0.1	日		
型枠設置	小型構造物		1.70 ÷ 15 m2/日	0.2	日	基礎コンクリート等	
	無筋・鉄筋構造物		28.80 ÷ 38 m2/日	0.8	日	捨てコン含む	
根継工	躯体 (コンクリート)	18-8-40	- ÷ 5 m2/日	-	日		
	型枠	小型	- ÷ 15 m2/日	-	日		
床固め	コンクリート		÷ 81 m3/日		日	設置	
	型枠		÷ 38 m2/日		日	設置	
小口止			÷ 1 箇所/日		日		
養生				3.0	日	3日/50m基準	
小計				4.5	日		
作業時	ブロック積		÷ 11 m2/日		日		
	石積み		÷ 13 m2/日		日	緑化ブロック積みを準用	
	連結石積み工		÷ 13 m2/日		日	緑化ブロック積みを準用	
	かごマット	多段積み		÷ 21 m/日		日	ふとん籠(H=0.5)を準用
		平張り		÷ 日数乗歩掛かりによる		日	
	袋詰玉石工		÷ 40 袋/日		日		
	床掘	レキ質土等	O. 45m3 BH	÷ 150 m3/日		日	
		レキ質土等	O. 80m3 BH	÷ 220 m3/日		日	
		レキ質土等	O. 28m3 BH	2.9 ÷ 35 m3/日	0.1	日	小規模土工
		軟岩		÷ 63 m3/日		日	
小計				0.1	日		
合計				4.6	日		

1. 数量総括表

2 . 護 床 工 計 算 書

3 . 仮 設 工 計 算 書

水替え日数計算書

測点	距離	護岸高	勾配	法長	平均	面積
				-		
				-	-	-
				-	-	-
計	0.0					-

護岸工 L = 21.00

コンクリート	=		m3
型枠	=		m2
均しコン	=		m3
均し型枠	=		m2
基面整正	=		m2
河床張コンクリート			
コンクリート	=	6.60	m3
捨てコンクリート			
コンクリート	=	3.30	m3

日当り施工数量一覧表

工種	規格等		数量	日施工量		備考	
コンクリート打設	小型構造物	人力打設	- ÷ 5 m3/日	-	日	基礎コンクリート等	
	無筋・鉄筋構造物	ポンプ、日300m3未満	9.90 ÷ 81 m3/日	0.2	日		
	間詰めコンクリート		÷ 4 m4/日		日		
	基面整正		÷ 200 m2/日		日		
型枠設置	小型構造物		- ÷ 15 m2/日	-	日	基礎コンクリート等	
	無筋・鉄筋構造物		- ÷ 38 m2/日	-	日	捨てコン含む	
根継工	躯体 (コンクリート)	18-8-40	- ÷ 5 m2/日	-	日		
	型枠	小型	- ÷ 15 m2/日	-	日		
床固め	コンクリート		÷ 81 m3/日		日	設置	
	型枠		÷ 38 m2/日		日	設置	
小口止			÷ 1 箇所/日		日		
養生				3.0	日	3日/50m基準	
小計				3.2	日		
作業時	ブロック積		÷ 11 m2/日		日		
	石積み		÷ 13 m2/日		日	緑化ブロック積みを準用	
	連結石積み工		÷ 13 m2/日		日	緑化ブロック積みを準用	
	かごマット	多段積み		÷ 21 m/日		日	ふとん籠(H=0.5)を準用
		平張り		÷ 日数乗歩掛かりによる		日	
	袋詰玉石工		÷ 40 袋/日		日		
	床掘	レキ質土等	O. 45m3 BH	÷ 150 m3/日		日	
		レキ質土等	O. 80m3 BH	÷ 220 m3/日		日	
		レキ質土等	O. 28m3 BH	÷ 35 m3/日		日	小規模土工
		軟岩		÷ 63 m3/日		日	
	小計				-	日	
	合計				3.2	日	

水替工

材料計算書

1式当り

名称	規格	算式	単位	数量	略図
掛樋工	ポリエチレン管 φ600		m	42.0	
土のう積					
	上流側			0.7	
	下流側			0.7	
		合計	m ²	1.4	
